


UPR ARECIBO

septiembre 2009



UPR ARECIBO

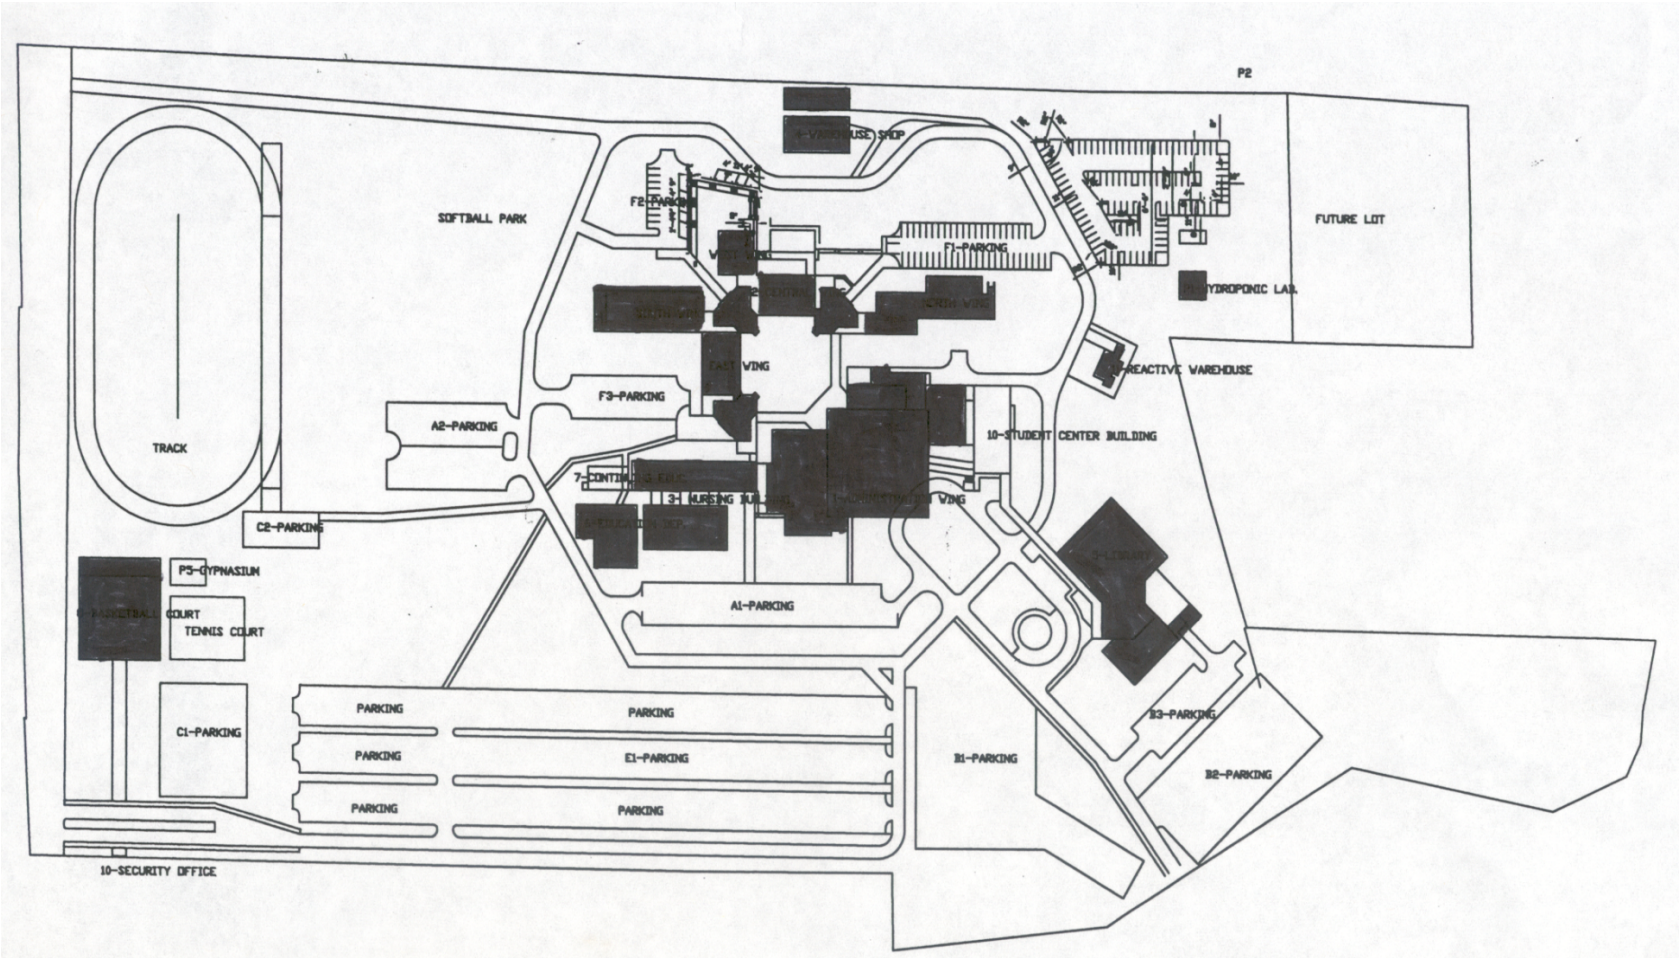



PROYECTOS

TERMINADOS:

-  CENTRO DE ESTUDIANTES (FASE I-IMPERMEABILIZACIÓN)
-  MEJORAS SISTEMA DE ILUMINACIÓN
-  IMPERMEABILIZACIÓN TECHOS ENFERMERÍA (FASE II-SALONES Y LABORATORIO)
-  ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO ALA SUR
-  NIVELACIÓN DE PISO
-  CANCHA DE BALONCESTO (FASE I-REEMPLAZO PISO) – LIQUIDACIÓN
-  OFICINAS DE LA FACULTAD

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO:

-  REEMPLAZO DE LA PLANTA DE AGUA HELADA PARA LA BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN:

-  ACTUALIZACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA "38 KV "
-  ELEVADOR EDIFICIO ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN:

-  PLANTA CENTRAL DE AGUA HELADA

POSPUESTOS:

-  AMPLIACIÓN CANCHA DE TENIS
-  AMPLIACIÓN ESTACIONAMIENTO
-  CENTRO DE CUIDO DIURNO




ACTUALIZACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA – UPR ARECIBO

DISEÑADOR: ING. ANDRES SÁNCHEZ CARRIÓN
COORDINADOR: ING. ÉRIC GUZMÁN
CONTRATISTA: AM ELECTRICAL INC.
INSPECCIÓN: SALAS ENGINEERING TECHNOLOGY

COSTO: \$880,000
FINANCIAMIENTO: PMP

ETAPA ACTUAL: CONSTRUCCIÓN
% DE EJECUCIÓN: 30%
FECHA DE COMIENZO: SEPTIEMBRE DE 2008
FECHA DE TERMINACIÓN: NOVIEMBRE DE 2009

DESCRIPCIÓN: Construcción de una Nueva Subestación Eléctrica de 38KV. El proyecto incluye la remoción de terreno, construcción de un muro de contención, relleno con material selecto. Construcción de nuevos cimientos e instalación de nueva estructura. Conexión al sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, demolición y disposición de la subestación existente.



ELEVADOR EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN – UPR ARECIBO

DISEÑADOR: ACOSTA ENGINEERING

COORDINADOR: ING. ERIC GUZMAN

CONTRATISTA: HARBOR ENGINEERING CONSTRUCTION CORP

INSPECCIÓN: INGEMA

COSTO: \$470,000

FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS

ETAPA ACTUAL: CONSTRUCCIÓN

% DE EJECUCIÓN: 50%

FECHA DE COMIENZO: 5 DE DICIEMBRE DE 2008

FECHA DE TERMINACIÓN: NOVIEMBRE DE 2009

DESCRIPCIÓN: El proyecto incluye la construcción de un elevador para el edificio principal de la Unidad y la adquisición e instalación de un "chair lift" para el Departamento de Ciencias Sociales. Para ello será necesario demoler áreas existentes, excavar, construir cimientos y estructura en hormigón, rellenar e instalar los equipos de comunicación vertical.



REEMPLAZO DE LA PLANTA DE AGUA HELADA PARA LA BIBLIOTECA

DISEÑADOR: PEDRO MEDINA Y ASOCIADOS
COORDINADOR: ING. ERIC GUZMAN
CONTRATISTA: COMFORT SYSTEM USA PUERTO RICO

COSTO: \$460,000
FINANCIAMIENTO: PMP

ETAPA ACTUAL: LIQUIDACIÓN DE CONTRATO


DESCRIPCIÓN: El proyecto conlleva la Remoción de la planta de Agua Helada existente y relocalización de la misma en área cercana a su localización actual. Remoción y disposición de equipo existente tales como bombas, paneles eléctricos, tubería, así como los escombros relacionados a la demolición. Adquisición e instalación de una nueva planta de Agua Helada, bombas, paneles eléctricos y controles.

"PLANTA CENTRAL DE AGUA HELADA"

DISEÑADOR: PEDRO MEDINA Y ASOCIADOS
COORDINADOR: ING. ERIC GUZMAN
CONTRATISTA:
INSPECCIÓN:

ETAPA ACTUAL: DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN (FASE I – EN ESPERA PERMISO DE CONSTRUCCIÓN)

DESCRIPCIÓN: Reemplazo de plantas de agua helada; actualizar / reemplazar componentes del circuito principal de agua helada; actualizar / reemplazar componentes del circuito secundario de agua helada; integrar la biblioteca en el circuito secundario, actualizar el sistema de controles, integrar los controles del servicio de la biblioteca en el sistema principal de controles y finalmente actualizar / reemplazar componentes del sistema de aire acondicionado en los salones de clases.

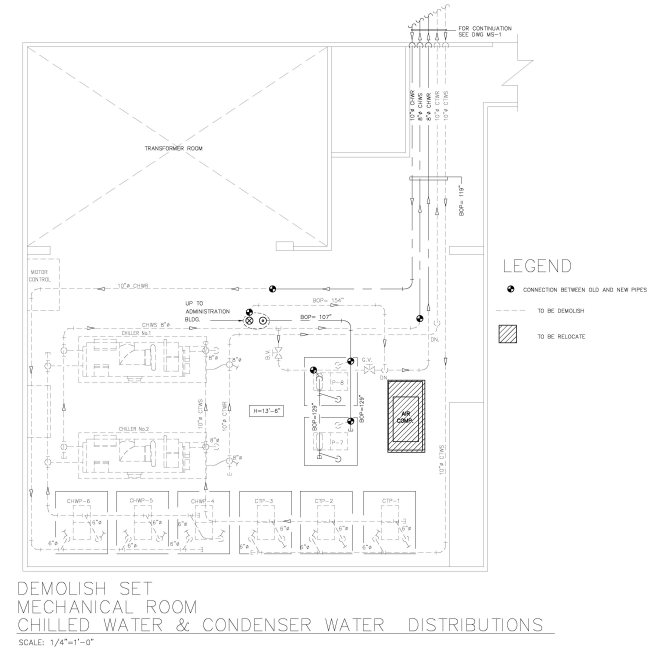

COSTO: NO PUBLICABLE HASTA SUBASTA FINAL
FINANCIAMIENTO: PEE
